



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO:	MPY-LP-16-2021	FECHA:	16-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANICIPO SIN I.V.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

50000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	1,186.26	
			ACUMULADO:	1,186.26	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.


NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 16-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANICIPIO SIN LV.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

50000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	1,186.26	
			ACUMULADO:	1,186.26	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 16-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANFICIPO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

500000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	784.20	
			ACUMULADO:	784.20	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAC  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021 FECHA: 16-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021 PERIODO: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A. \$ 1,763,615.51 INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN LV.A. \$ 529,084.65 TERMINO: 19-dic-21

50000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	784.20	
			ACUMULADO:	784.20	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 16-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANICIPIO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

500000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2". TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	945.88	
			ACUMULADO:	945.88	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'	

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 16-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANFICPO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

50000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
				DEL PERIODO:	945.88	
				ACUMULADO:	945.88	
ANTES		DURANTE	DESPUES			
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'			

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.


NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO




## REPORTE FOTOGRAFICO


## ESTIMACION 1


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA


No. DE CONTRATO:	MPY-LP-16-2021	FECHA:	16-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

50000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	698.61	
			ACUMULADO:	698.61	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO:	MPY-LP-16-2021	FECHA:	16-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

50000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	698.61	
			ACUMULADO:	698.61	
<p style="text-align: center;"><b>ANTES</b></p>  <p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'</p>		<p style="text-align: center;"><b>DURANTE</b></p>  <p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'</p>		<p style="text-align: center;"><b>DESPUES</b></p>  <p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'</p>	

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAK  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENÉ OSWALDO BLANCO GAMBOA  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.





# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO




## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO:	MPY-LP-16-2021	FECHA:	30-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

500000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	698.61	
			ACUMULADO:	698.61	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 30-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANFICIO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

500000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	945.88	
			ACUMULADO:	945.88	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
<p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'</p>		<p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'</p>		<p>COORDENADAS: LAT. N 21°27' LOG. W -89°65'</p>	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO:	MPY-IP-16-2021	FECHA:	30-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANFICIPO SIN I.V.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

50000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	784.20	
			ACUMULADO:	784.20	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



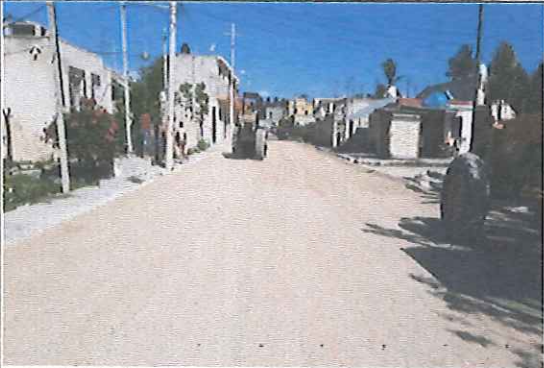


## REPORTE FOTOGRAFICO


## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA


No. DE CONTRATO:	MPY-IP-16-2021	FECHA:	30-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN LV.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANTIPO SIN LV.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

500000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	ANTERIOR:	0.00	M2
		DEL PERIODO:	1,186.26	
		ACUMULADO:	1,186.26	

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOÉ REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## REPORTE FOTOGRAFICO

## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-IP-16-2021      FECHA: 30-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANTIPO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

50000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	ANTERIOR:	0.00	M2
		DEL PERIODO:	719.68	
		ACUMULADO:	719.68	
		<b>ANTES</b>		<b>DURANTE</b>
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO




## REPORTE FOTOGRAFICO


## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021      FECHA: 30-nov-21  
 FECHA DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021      PERIODO: DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51      INICIO: 21-oct-21  
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 529,084.65      TERMINO: 19-dic-21

50000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0° A 2°, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	M2
			DEL PERIODO:	719.68	
			ACUMULADO:	719.68	
ANTES		DURANTE		DESPUES	
					
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'		COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'	

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.


  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





## REPORTE FOTOGRAFICO


## ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA


No. DE CONTRATO:	MPY-LP-16-2021	FECHA:	30-nov-21
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021	PERIODO:	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,763,615.51	INICIO:	21-oct-21
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 529,084.65	TERMINO:	19-dic-21

5011100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 M ANCHO Y 1.00 M ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 M DE ALTURA A BASE DE PTR DE 1.5 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	CANTIDAD	ANTERIOR:	0.00	PZA
			DEL PERIODO:	1.00	
			ACUMULADO:	1.00	
DESPUES					
					
COORDENADAS: LAT. N 21°27' LONG. W -89°65'					

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

  
 ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

  
 C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
 CONTRATISTA  
 GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.
